


# PLANNING

Project: Aanleg rotonde Stationsweg / Onstluiting KvN  
 datum: 02-05-2019

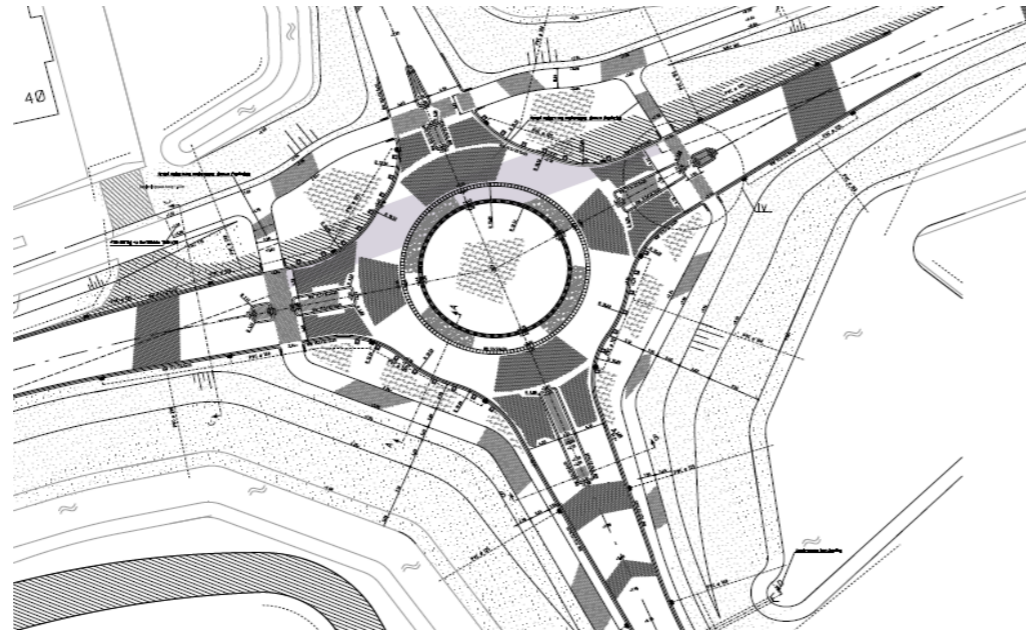

Werzaamheden:	kwartaal:	2019				2020				2021				2022	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
Voorbereiding graven watergangen en voorbelasting															
Gehele voorbereiding nutsbedrijven incl. vergunningen															
Voorbereiding aanleg verhardingen															
Aanvraag/looptijd watervergunning werz. gemeente															
Uitvoering vergraven watergangen			april/mei												
Uitvoering verleggen K&L naar (tijdelijke) locatie			mei/juni												
Uitvoering aanbrengen voorbelasting in lagen om de 10 weken			juni												
Duur voorbelasting blijft liggen															
Uitvoering verwijderen voorbelasting											april				
Verleggen K&L naar definitieve locatie											april				
Nemen verkeerbesluit door WSHD															
Uitvoering aanleg verhardingen											mei	juli			
